




MANUAL DE GESTÃO DE RISCOS

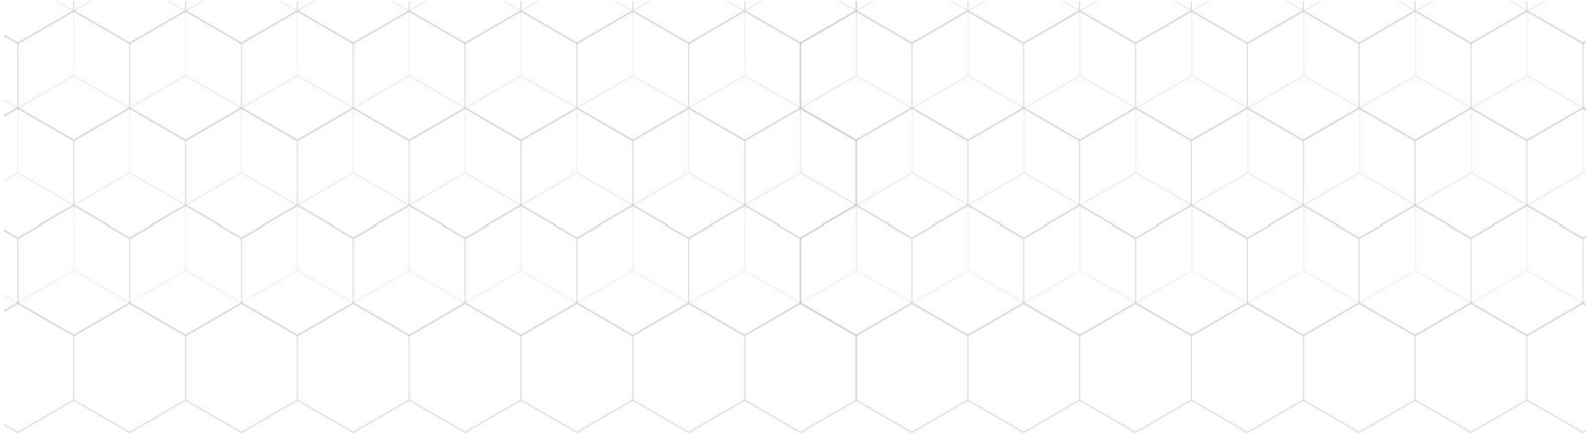

Governador do Distrito Federal

Ibaneis Rocha Barros Junior

Vice-Governador do Distrito Federal

Marcus Vinicius Britto de Albuquerque Dias

Secretário de Transporte e Mobilidade

Valter Casimiro Silveira

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF

Conselho de Administração

Handerson Cabral Ribeiro

Julio Cesar Barbosa Melo

Pedro Duarte de Oliveira

Camile Sabino Bezerra Corrêa

Carla Chaves Pacheco

Murilo Maia Herz

Hérlio Mariano Araujo

Diretoria Colegiada

Diretor-Presidente

Handerson Cabral Ribeiro

Diretor de Administração

Marcus Aurélio de Souza Marinho

Diretor de Operação e Manutenção

Flávio Murilo Gonçalves Prates de Oliveira

Diretor Técnico

Luiz Carlos Tanezini

Diretor Financeiro

Carlos Luiz Barroso Júnior

Chefe de Gabinete

Flávia Carneiro de Oliveira

Chefe de Governança e Controle Interno

Roberta Alves de Castro

Gerência de Riscos

Gustavo Mello



Sumário

<i>Apresentação</i>	4
História da Gestão de Riscos no mundo	4
História da Gestão de Riscos no METRÔ-DF	4
Governança Corporativa	7
<i>Objetivos da Gestão de Riscos no METRÔ-DF</i>	10
<i>Princípios da Gestão de Riscos no METRÔ-DF</i>	11
<i>Objeto da Gestão de Riscos no METRÔ-DF</i>	12
<i>Estrutura da Gestão de Riscos no METRÔ-DF</i>	13
<i>Instâncias e responsabilidades</i>	15
<i>Processo de Gestão de Riscos no METRÔ-DF</i>	17
Concepção - Estabelecimento do escopo, contexto e critérios	19
O escopo:	19
Os contextos externo e interno:	19
Os critérios de risco	20
Processo de avaliação de riscos	21
Identificação dos riscos	21
Análise dos riscos	22
Avaliação dos riscos	23
Tratamento dos riscos	24
Seleção de opções de tratamento do risco	24
O Plano de Tratamento de Riscos	26
Monitoramento e análise crítica	26
Registro e Relato	27
Comunicação e Consulta	28
<i>Formulário de Avaliação de Risco de Decisão</i>	29
Orientações Gerais	29
<i>Referências Bibliográficas</i>	31
<i>Glossário</i>	32
<i>Aprovação e Vigência</i>	35
<i>Anexo I</i>	36

Apresentação

História da Gestão de Riscos no mundo:

A história da gestão do risco remete aos tempos primórdios da humanidade e teve significativo avanço no Renascimento, período consagrado pelo questionamento de teorias antes aprovadas e de substanciais avanços científicos, quando o homem entendeu que poderia se antever aos riscos que afetariam o atingimento de seus objetivos, não ficando mais a mercê de oráculos e adivinhos, desafiando deuses, ou das forças da natureza, que *estabeleceu padrões que dão origem ao retorno dos eventos, **mas apenas na maior parte dos casos*** (Gottfried von Leibniz, 1703), e então passou a gerenciá-los de forma sistêmica nas mais diversas áreas e campos de atuação, identificando, mensurando, medindo e, principalmente, decidindo a respeito da disposição de enfrentar ou não àquele risco e suas consequências, possibilitando inúmeros avanços nas finanças, na tecnologia, agricultura, engenharia, ciência, medicina, serviços públicos em geral e até mesmo na gestão doméstica.

“Você deseja uma válvula que não vaze e faz todo o possível para desenvolvê-la. Mas no mundo real só existem válvulas que vazam. Você tem que determinar o grau de vazamento que pode tolerar.”

Obituário de Arthur Rudolph, cientista que desenvolveu o foguete Saturno 5, que lançou a primeira missão do homem à Lua, em *The New York Times*, 3 de janeiro de 1996.

“Risco” é uma palavra que deriva do italiano antigo *risicare*, que significa “ousar”, conforme Peter L. Bernstein cita em seu livro *Desafio aos Deuses*, 1997. Assim, o risco não é um destino, e sim, uma opção, das ações que ousamos tomar que dependem do nosso grau de liberdade de opção.

O objetivo central da gestão de riscos ao longo da história é o de gerenciar fatos não imprevisíveis, porém, impensáveis, permitindo aos tomadores de decisões optarem de forma consciente e racional, não mais empírica, por enfrentar um risco com consequências contornáveis, mesmo que seus controles resultem em riscos residuais, menores que o risco primal.

História da Gestão de Riscos no METRÔ-DF:

O trabalho de Gestão de Riscos teve início após a atuação pela Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF, com a publicação do DECRETO nº 37.302, de 29 de abril de 2016, estabelecendo os modelos de boas práticas gerenciais em Gestão de Riscos e Controle Interno a serem adotados na Administração Pública do Distrito Federal.

Tal decreto estabelece, principalmente, as metodologias recomendadas para serem implementadas no âmbito de toda a Administração Pública do Distrito Federal, como a ISO/IEC 31000 que, à época, se tratava da primeira versão (2009), atualmente

está em sua segunda versão (2018). A ISO 19011 estabeleceu as diretrizes para a auditoria de sistemas de gestão, a fim de fundamentar as auditorias baseadas em Risco - ABR desenvolvidas pela própria CGDF nas unidades vinculadas ou realizadas pela própria entidade. Por fim, o COSO-2013 foi consolidado como parâmetro para os controles.

Em meados de 2016, a CGDF realizou rodadas de reuniões no METRÔ-DF para o devido alinhamento e fornecer as orientações quanto à implementação da Gestão de Riscos, o que deu resultado a um Relatório de Auditoria, no qual propunha a criação do Comitê de Gestão de Riscos e o estabelecimento da Política de Gestão de Riscos. A Decisão do Conselho de Administração, exarada na 260ª Reunião Ordinária de 18/03/2016, aprovou a Política de Gestão de Riscos e a criação do Comitê de Gestão de Riscos, o que foi concretizado com a publicação da Portaria Conjunta nº09, de março de 2016, onde se teve o início das atividades da Companhia, com treinamentos para capacitação e engajamento.

Em sequência, houve o cumprimento das seguintes entregas:

1. Cronograma para a implantação da Gestão de Riscos;
2. Avaliação de Maturidade;
3. Treinamento para a identificação dos riscos;
4. Estabelecimento do contexto;
5. 1º Ciclo de Reuniões Técnicas: 22,24 e 29/11 e 01/06 e 08/12/2016;
6. Treinamento, avaliação e estabelecimento de controles;

Com isso, foram desenvolvidos os seguintes processos:

1. Matriz de Riscos do Metaprocesso de Aquisição de Bens e Contratação de Prestação de Serviços;
2. Matriz de Riscos da Manutenção;
3. Matriz de Riscos PRELIMNAR da Diretoria Financeira e Comercial – DFC (não concluída);
4. Matriz de Riscos sobre a Participação de empresas envolvidas na Lava-Jato em licitações com o METRÔ-DF.

Já em 2018, foi ministrada uma capacitação em Gestão de Riscos e Auditoria Baseada em riscos pela CGDF uma auditoria baseada em riscos.

Em 2019, houve a alteração da composição do Comitê e em 2020, meados de maio e junho, houve nova capacitação da CGDF para empregados do Metrô sobre riscos, já com a implantação da Área de Governança e Controle Interno, com as 03 Gerências, entre elas a Gerência de Risco. Oportunidade na qual foram treinados 82 (oitenta e dois) empregados da Companhia de todas as diretorias, inclusive a CGDF realizou palestra de conscientização para todos os membros da Alta Administração.

Atualmente, encontra-se vigente a Instrução de Serviço SEI-GDF n.º 316/2020 - METRO-DF/PRE/GAB de 08/07/2020, com a implantação do Comitê de Gestão de Risco com definição de integrantes e atribuições do Comitê de Riscos.

São várias as fontes que orientam a administração pública para que adote a Gestão de Riscos como um instrumento de governança corporativa, como o caso da lei nº13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a IN-05/2016-MPOG e o DECRETO nº39.736/2019 que estabeleceu a política de governança pública e *compliance* no âmbito do Distrito Federal.

Em 26 de junho de 2020, foi aprovada a Política De Governança, Gestão De Riscos e Integridade por meio da Decisão Nº 016/2020-CA/METRÔ-DF, exarada na 311ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, após a Decisão da Diretoria Colegiada na 1290ª Reunião Ordinária ([41643819](#)), no dia 10 de junho de 2020. Oportunidade na qual a GCI/Gerência de Risco estabeleceu revisou e estabeleceu novas diretrizes quanto à atuação de gestão de risco na Companhia.

A Política de Governança, Gestão de Riscos e Integridade baliza este Manual, que tem como objetivo fornecer informações claras, técnicas e objetivas aos administradores da Companhia, gestores, demais empregados responsáveis pela Gestão de Riscos e qualquer outro interessado, em apenas um documento. Ressaltado que a Gerência de Risco necessita do comprometimento da Alta Administração assim como dos proprietários de riscos, lotados nas áreas operacionais da Companhia, a fim de que o processo de risco produza seus devidos resultados.

Por fim, importante mencionar que este manual aborda um referencial metodológico de identificação, análise e tratamento de Gestão de Riscos do Metrô, detalhando e regulamentando objetivos, princípios, diretrizes, responsabilidades, dentre outras providências, o que impactou no trabalho de 2020 quanto às matrizes de risco e tratamento realizadas junto às Diretorias, as quais vêm sendo implementadas pelas áreas afins e devidamente monitoradas.

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, governança corporativa é “o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas”.


A Gestão de Riscos deve ser integrante do sistema de governança, pois ela deve apoiar a tomada de decisões e o estabelecimento de estratégias no nível da Alta Administração, promovendo a melhoria dos controles internos, da transparência e da prestação de contas.

A Gestão de Riscos deve fazer parte da cultura da empresa, permeando todos os processos de tomada de decisão, em todos os níveis, como reflexo do comportamento da Alta Administração em uma estrutura clara de governança que define atribuições e responsabilidades dos agentes que:

- Identificarão e avaliarão riscos;
- Definirão os tratamentos de riscos;
- Tomarão decisões referentes aos riscos;
- Monitorarão dos riscos;
- Fiscalizarão todo o processo de Gestão de Riscos.

O Institute of Internal Auditors – IIA trás o Modelo de Três Linhas (antigo Três Linhas de Defesa), que ajuda as organizações a identificar estruturas e processos que melhor auxiliam na consecução dos objetivos e facilitam uma forte governança e gerenciamento de riscos, feito de forma personalizada para a Companhia.





Onde os papéis de cada uma das linhas são:

Primeira linha:

- Lidera e dirige ações (incluindo gerenciamento de riscos) e aplicação de recursos para atingir os objetivos da organização.
- Mantém um diálogo contínuo com a alta administração, por meio de seus Diretores e relata: resultados planejados, reais e esperados, vinculados aos objetivos da organização e risco.
- Estabelece e mantém estruturas e processos apropriados para o gerenciamento de operações e riscos (incluindo controle interno).
- Garante o cumprimento das expectativas legais, regulamentares e éticas.

Segunda linha:

- Fornece experiência, suporte, monitoramento e desafios complementares relacionados ao gerenciamento de riscos, incluindo:
 - o desenvolvimento, implementação e melhoria contínua de práticas de gerenciamento de riscos (incluindo controle interno) em um nível de processo, sistemas e entidade.
 - a consecução de objetivos de gerenciamento de riscos, como: conformidade com leis, regulamentos e comportamento ético aceitável; controle interno; segurança da informação e tecnologia; sustentabilidade e garantia de qualidade.
- Fornece análises e relatórios sobre a adequação e eficácia do gerenciamento de riscos (incluindo controle interno).

Terceira linha:

- Mantém a principal responsabilidade perante a Alta Administração e a independência das responsabilidades da administração.
- Comunica asseguração e consultoria independentes e objetivas à gerência e ao corpo diretivo sobre a adequação e eficácia da governança e do gerenciamento de

riscos (incluindo controle interno) para apoiar a consecução dos objetivos organizacionais e promover e facilitar a melhoria contínua.

- Relata prejuízos à independência e objetividade à Alta Administração e implementa controles, conforme necessário.

A Alta Administração baseia-se nas atuações e informações oriundas das três linhas para supervisionar e buscar a consecução de seus objetivos, pelos quais prestam contas às partes interessadas, sendo a primeira linha responsável por fornecer uma garantia valiosa sobre os resultados planejados, reais e previstos, sobre os riscos e sobre a gestão de riscos, recorrendo à experiência e ao conhecimento direto. Aqueles com funções de segunda linha fornecem garantia adicional em assuntos relacionados a riscos. Devido à independência da auditoria interna em relação à gerência, a garantia que ela oferece carrega o mais alto grau de objetividade e confiança além daquilo que aqueles com funções de primeira e segunda linha podem fornecer à alta administração.

Uma governança eficaz requer a atribuição apropriada de responsabilidades, bem como um forte alinhamento de atividades por meio de cooperação, colaboração e comunicação, o que deve ser confirmado pela alta administração, promovendo as devidas adequações nas suas estruturas e processos para que os atenda conforme o planejado.

Objetivos da Gestão de Riscos no METRÔ-DF

Conforme o artigo 32 da Política De Governança, Gestão De Riscos E Integridade, são objetivos da Gestão de Riscos:

I - Assegurar a existência de um processo estruturado de gerenciamento de riscos como forma de contribuição para a continuidade dos serviços prestados às partes interessadas;

II - Contribuir para a melhoria contínua da eficiência, da eficácia e da efetividade dos serviços públicos prestados à sociedade;

III - Aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos organizacionais, reduzindo os riscos a níveis aceitáveis;

IV - Possibilitar que os responsáveis pela tomada de decisão em todos os níveis, tenham acesso tempestivo a informações suficientes quanto aos riscos aos quais o METRÔ-DF está exposto; e,

V - Melhorar a aprendizagem organizacional, prevenindo perdas e aumentando a capacidade de adaptação da organização às mudanças ambientais.

O principal objetivo da Gestão de Riscos é de aumentar o grau certeza no atingimento de objetivos e metas dentro do prazo, do custo e das condições pré-estabelecidas, conceito este diretamente relacionado à eficiência (fazer certo as coisas) e eficácia (fazer a coisa certa), de forma efetiva, conforme princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

A Gestão de Riscos do METRÔ-DF auxilia a Alta Administração na tomada de decisão, com segurança razoável, para o cumprimento da missão e visa, além do apoio ao alcance dos objetivos, a criação e proteção de valor, melhoria do desempenho, incentivo à inovação, uma vez que risco é inerente à qualquer atividade, seja pessoal ou profissional, portanto, ter consciência do risco e a habilidade de administrá-lo, conforme à disposição da empresa de correr riscos e dos administradores de tomar decisões, são elementos-chave para o sucesso do negócio.

Portanto, quando a empresa se apropria da gestão de riscos, com uma implementação sólida e bem estruturada, os objetivos são alcançados trazendo os mais diversos benefícios, como o amparo aos administradores e demais gestores, fornecendo as melhores informações para a tomada de decisões, favorecendo ao aproveitamento de oportunidades e antecipação a situações desagradáveis, trazendo economia, eficiência e eficácia para a Companhia e com isso, melhorando tanto a reputação quanto a relação com as partes interessadas, além de favorecer o planejamento, a governança, as devidas responsabilidades e responsabilizações, promovendo o bem-estar geral dos empregados.

Princípios da Gestão de Riscos no METRÔ-DF

Os princípios são considerados na estrutura e nos processos de Gestão de Riscos da Companhia, eles são complementares uns aos outros, interagindo entre si para o alcance dos melhores resultados.

A Gestão de Riscos do METRÔ-DF se apoiará nos seguintes princípios:

- **Ser inclusiva e parte integrante dos processos organizacionais e das tomadas de decisão** – a Gestão de Riscos deve ser integrada aos processos decisórios da Companhia, sempre que houver um custo-benefício favorável, incorporando-a aos processos organizacionais como etapa necessária para a tomada de decisão, incluindo as partes interessadas em momento oportuno e apropriado, considerando seus conhecimentos, pontos de vista e percepções, aproximando-os do processo.
- **Abordar explicitamente a incerteza** – o risco pode se apresentar de forma positiva, negativa ou ambos, e todos estes aspectos devem ser considerados para que, além de evitar que os objetivos não sejam alcançados, os gestores também estejam preparados para aproveitar as oportunidades.
- **Ser sistemática, estruturada e personalizada** – a estruturação sistêmica da Gestão de Riscos permite resultados consistentes e comparáveis. Cada processo, porém, é personalizado, levando em conta seu escopo e os objetivos que se pretende atingir.
- **Basear-se nas melhores informações disponíveis** – considerando informações históricas, atuais e expectativas futuras e quaisquer limitações e incertezas a elas associadas, que devem ser dispostas de forma clara, oportuna e disponível para as partes interessadas pertinentes.
- **Considerar fatores humanos e culturais** – a multiplicidade do comportamento humano, a cultura organizacional e a maturidade quanto à Gestão de Riscos influenciam na percepção do risco por seus responsáveis e em todos os aspectos de sua gestão, em cada nível ou estágio, portanto, a boa gestão de riscos não deve desprezar estes fatores, cruciais para seu êxito.
- **Reagir a mudanças de forma oportuna, dinâmica e iterativa, promovendo a melhoria contínua** – antecipar, detectar, reconhecer e responder de maneira adequada às mudanças de contexto interno e externo na medida em que elas ocorrem, uma vez estas mudanças podem gerar novos riscos, mudar ou extinguir riscos previamente detectados. A Gestão de Riscos é feita de forma iterativa, por meio de ciclos de revisão, implementada de forma progressiva e gradual, visando sua melhoria contínua.
- **Ser liderada pela Alta Administração** – a Alta Administração deve mostrar liderança e comprometimento com a Gestão de Riscos dirigindo, apoiando e monitorando sua implementação e melhoria contínua, servindo como exemplo aos demais empregados da Companhia que, direta ou indiretamente atuem gerenciando riscos, suas causas e possíveis consequências, bem como a implementação dos controles definidos.

Objeto da Gestão de Riscos no METRÔ-DF

Os objetos da Gestão de Riscos no Metrô poderão ser cada projeto, processo, atividade e ação que estejam relacionadas aos objetivos estratégicos da Companhia, bem como os recursos e unidades administrativas e quaisquer outros projetos, processos, atividades e ações, desde que bem definidos os objetivos almejados.

Estrutura da Gestão de Riscos no METRÔ-DF

A base da estrutura da Gestão de Riscos é a liderança e o comprometimento da Alta Administração e unidades de supervisão, que deve dar a sustentação aos demais pilares dessa estrutura para, desta forma, em consonância com o contexto que se apresenta, alinhar a Gestão de Riscos às estratégias, objetivos e cultura organizacional, mostrando seu valor para a Companhia e para as partes interessadas, monitorando os riscos sistematicamente, em conformidade com a quantidade de riscos que pode ser assumida, ou não, reconhecendo todas as obrigações e compromissos voluntários.

É responsabilidade da alta administração, além de alocar todos os recursos necessários, emitir e manter atualizada a política de Gestão de Riscos, personalizar e implementar todos os seus componentes, atribuindo autoridades, responsabilidades e responsabilizações adequadas.

Para viabilizar esta atuação, a Alta Administração conta com a unidade administrativa de Governança e Controle Interno, cujo um dos papéis principais é o de definir as responsabilizações pela Gestão de Riscos e papéis de supervisão no âmbito da Companhia, com o auxílio da sua Gerência de Riscos, que compõe, junto com o Comitê de Gestão de Riscos e dos Proprietários/Gestores de Riscos, a estrutura organizacional responsável por esta atividade.

- **Gerência de Risco** – estrutura, executa e monitora a Gestão de Riscos, de forma integrada e inclusiva como Comitê de Gestão de Riscos e os empregados envolvidos no processo, projeto, tarefa ou ação a ser gerenciada, dando suporte técnico e capacitação. É a unidade responsável também por cientificar a Alta Administração e propor as melhorias pertinentes.
- **Comitê de Gestão de Riscos** – grupo de trabalho instituído por meio de Instrução de Serviço da Presidência, cuja composição caracteriza um grupo múltiplo e competente, com integrantes das diversas Diretorias e unidades da empresa, que é responsável pelo processo da Gestão de Riscos, definido mais a frente neste manual.
- **Proprietários/Gestores de Riscos** – são empregados da Companhia responsáveis por um processo, atividade ou ação do Planejamento Estratégico Institucional, gestor de projeto, de unidades administrativas ou de nível operacional e assessores, com responsabilidade e autoridade para gerenciar os riscos de sua responsabilidade, capazes de definir processos de trabalho prioritários, identificar, analisar, avaliar e tratar os riscos, sob orientação e coordenação da Gerência de Risco.

Os demais pilares da estrutura da Gestão de Riscos são:

- **Integração** – a gestão de riscos não deve ser separada, mas sim, uma parte do propósito organizacional, governança, liderança e comprometimento, estratégias, objetivos e operações, onde todos os empregados têm a responsabilidade de gerenciar riscos nos diversos níveis e graus de complexidade.

- **Concepção** – para conceber uma estrutura de Gestão de Riscos, devemos analisar os contextos interno e externos, a Alta Administração deve articular seu comprometimento contínuo, por meio da Política, deste manual e o próprio exemplo prático e claro para todas as partes interessadas, no dia-a-dia de sua atuação na Companhia, com o estabelecimento de uma comunicação (informar o público alvo) e consulta (retorno pelos e para os integrantes da Gestão de Riscos) oportunas e tragam informações pertinentes, consolidadas, objetivas e claras que contribuam efetivamente para as decisões e melhorias, com a alocação dos recursos necessários e a clara atribuição dos papéis organizacionais, autoridades, responsabilidades e responsabilizações.
- **Implementação** – adequadamente concebida e implementada, com arranjos bem compreendidos e praticados por meio de instrumentos adequados, a Gestão de Riscos se torna parte de todas as atividades da Companhia, inclusive das tomadas de decisões, que devem ser identificadas por quem, onde e quando acontecem, mudando seu processo, quando aplicáveis, bem adaptadas à toda mudança de contexto que porventura existir, permitindo que as incertezas sejam abordadas explicitamente, para que os riscos sejam tratados e as oportunidades aproveitadas.
- **Avaliação** – com o objetivo de apoiar o alcance dos objetivos pela Companhia, a estrutura da Gestão de Riscos deve ser periodicamente avaliada, mensurando seu desempenho em relação ao propósito, planos de implementação, indicadores e comportamento esperado.
- **Melhoria** – deve vir através da adaptação ao contexto e suas possíveis mudanças e da melhoria contínua, que deve acontecer sempre que oportuno, para o aprimoramento da Gestão de Riscos, melhorando, inclusive, o valor da Companhia.

Instâncias e responsabilidades (Matriz de Responsabilidade)

- **Conselho de administração** – aprovar a Política e Manual e suas alterações, bem como direcionar e monitorar os achados de risco e plano de tratamento.
- **Diretoria Colegiada** – aprovar normativos, limites de exposição ao risco, riscos chave e alterações na estrutura da Gestão de Risco, controlar a execução do trabalho de identificação e plano de tratamento entre seus proprietários de risco.
- **Gerência de riscos** – coordenar e executar a metodologia a respeito da matriz de risco e respectivo plano de tratamento na Companhia.
- **Comitê de Gestão de Riscos** – monitorar as matrizes de riscos e plano de tratamento junto ao SAEWEB ou outro mecanismo.
- **Proprietário/ Gestores de Riscos** – executar e gerir a matriz de riscos e implantar as ações de controle do plano de tratamento.

Ressalta-se que essa matriz de responsabilidade expressa competências as quais se encontram dispostas na Política De Governança, Riscos e Integridade, sem prejuízo do disposto em outros normativos (Regimento Interno, Instruções de Serviço etc), destacando-se:

Da Gerência de Riscos (artigo 35):

- I. Estruturar, executar e monitorar o Programa de Gestão de Riscos;*
- II. Criar o manual de Gestão de Riscos;*
- III. Orientar e treinar os servidores e promover outras ações relacionadas à implementação do Programa de Gestão de Riscos, em conjunto com as demais unidades/setores do METRÔ-DF; e,*
- IV. Notificar diretamente a Alta Administração sobre a ocorrência de eventuais falhas encontradas no desenvolvimento das funções e responsabilidades, bem como propor alternativas para sua estruturação e aperfeiçoamento.*

Do Comitê de Gestão de Riscos (artigo 34):

- I. Identificar os riscos – criar listagem abrangente de riscos relacionados a possíveis eventos que possam criar, aumentar, reduzir, acelerar ou atrasar a realização de ações ou projetos do METRÔ-DF;*

- II. *Analisar os riscos - apreciar as causas e as fontes de risco, suas consequências positivas e negativas e a probabilidade de que essas consequências possam ocorrer e possíveis impactos que podem gerar no METRÔ-DF. Apontar melhorias nas ações ou processos;*
- III. *Avaliar os riscos - auxiliar na tomada de decisão com base nos resultados da análise. Avaliar a probabilidade de o risco acontecer e sua criticidade. Definir quais os riscos necessitam de tratamento, priorização e possíveis ações a serem tomadas;*
- IV. *Tratar os riscos – definir estratégias e executar ações para minimizar, mitigar, prevenir e eliminar o risco;*
- V. *Monitorar os riscos - verificar, supervisionar, observar criticamente e acompanhar as situações para identificar mudanças necessárias, continuamente; e,*
- VI. *Auxiliar, monitorar e supervisionar a atuação dos Gestores de Riscos.*

Dos Proprietários de Riscos (artigo 37):

- I. *Assegurar que o risco seja gerenciado de acordo com a política de gestão de riscos do METRO-DF;*
- II. *Identificar, avaliar e implementar as respostas aos riscos;*
- III. *Monitorar o risco ao longo do tempo, de modo a garantir que as respostas adotadas resultem na manutenção do risco em níveis adequados;*
- IV. *Garantir que as informações adequadas sobre o risco estejam disponíveis para a Comitê de Gestão de Riscos; e,*
- V. *Propor medidas de controles internos aos riscos identificados e avaliados.*

Processo de Gestão de Riscos no METRÔ-DF

O processo de Gestão de Riscos guia os atores metodologicamente e deve ser aplicado em todos os níveis, considerando o nível estratégico, o tático, o operacional, e de programas e projetos.


No METRÔ-DF serão consideradas as seguintes categorias de riscos:

- **Estratégicos** – riscos decorrentes da falta de capacidade ou habilidade da unidade em proteger-se ou adaptar-se às mudanças que possam interromper ou desviar o alcance de objetivos e a execução da estratégia prevista no Planejamento Estratégico Institucional ou qualquer outro instrumento de aponte a significativa relevância
- **De Conformidade** – riscos decorrentes da incapacidade ou inabilidade da Companhia em cumprir com as legislações aplicáveis ao seu negócio e não elabore, divulgue e faça cumprir suas próprias normas, procedimentos, regulamento ou outro instrumento normativo aplicável;
- **Financeiros** – riscos decorrentes da inadequada gestão orçamentária e financeira, das aplicações de recursos em operações novas, desconhecidas e/ou complexas, de alto risco;
- **Operacionais** – riscos decorrentes da inadequação ou falha dos processos internos, pessoas ou de eventos externos em processos finalísticos do core institucional e/ou missão;
- **Ambientais** – riscos decorrentes da gestão inadequada de questões ambientais, como por exemplo: emissão de poluentes, disposição de resíduos sólidos e outros;
- **De Tecnologia da Informação** – riscos decorrentes da indisponibilidade ou inoperância de equipamentos e sistemas informatizados que prejudiquem ou impossibilitem o funcionamento ou a continuidade normal das atividades da instituição. Representado, também, por erros ou falhas nos sistemas informatizados ao registrar, monitorar e contabilizar corretamente transações ou posições;
- **De Recursos Humanos** – riscos decorrentes da falta de capacidade ou habilidade da instituição em gerir seus recursos humanos de forma alinhada aos objetivos estratégicos definidos.
- **De Integridade** - riscos que podem afetar a probidade da gestão dos recursos públicos e das atividades da organização, causados por desvios éticos.

O processo de Gestão de Riscos é iterativo, embora apresente uma estrutura sequencial e deve ser colaborativo, participativo e multidisciplinar, com a contribuição de pessoas que conheçam e dominem aquele processo, projeto, ação, tarefa etc., e deve, necessariamente, seguir cada uma das etapas apresentadas abaixo e detalhadas metodologicamente na sequência:

- estabelecimento do escopo, contexto e critérios;
- identificação dos riscos;
- análise dos riscos;
- avaliação dos riscos;

- tratamento dos riscos;
- comunicação e consulta com partes interessadas;
- monitoramento e análise crítica;
- registro e relato.

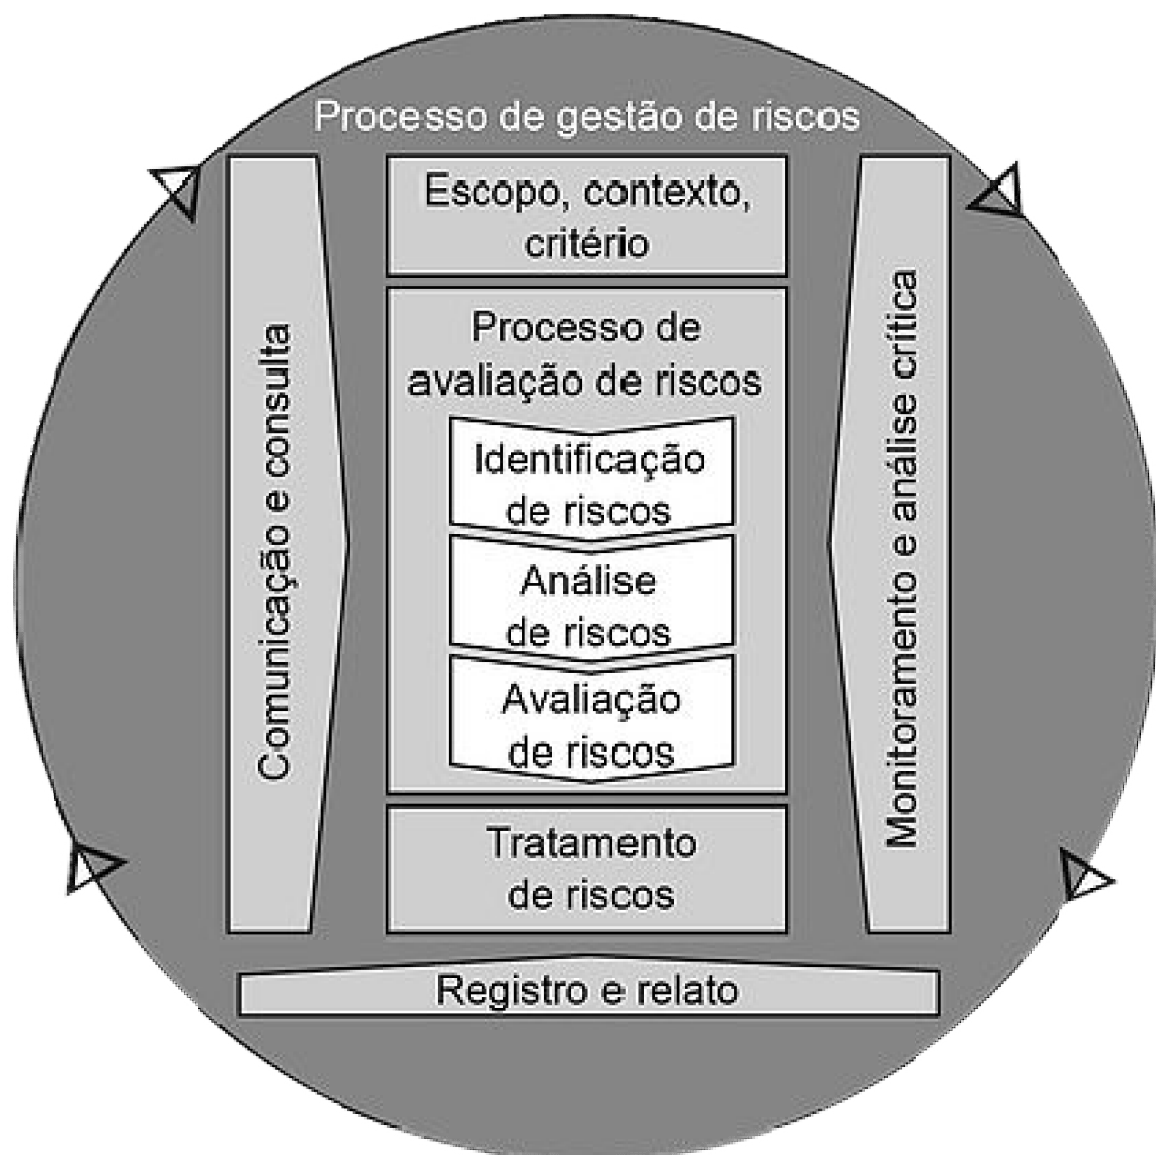

Concepção - Estabelecimento do escopo, contexto e critérios:

Convém destacar que a Gestão de Riscos seja personalizada a cada processo, projeto, etc., que ela compreender e, para isso, deve-se estabelecer o escopo, contexto e critérios para cada um deles visando à definição do escopo e a compreensão dos contextos externos e internos, para uma avaliação eficaz e proposições adequadas de tratamentos de riscos.

Para trazer luz ao conteúdo da Gestão de Riscos, deve-se fazer uma introdução sobre o tema abordado, expondo conceitos que o explique, trazendo fatos históricos, quando conveniente, necessários a elucidar o core do trabalho que será desenvolvido.

O escopo:

O escopo em consideração deve ser abordado de forma clara e direta, quais seus objetivos e qual o seu alinhamento com os objetivos estratégicos do METRÔ-DF, para isso, deve-se considerar:

- objetivos e decisões que precisam ser tomadas;
- resultados esperados em cada etapa do processo;
- tempo, localização e pessoas da área técnica envolvidas nesse processo;
- ferramentas e técnicas apropriadas para o processo de avaliação de riscos;
- recursos requeridos, responsabilidades e registros a serem mantidos;
- outros projetos, processos e atividades.

Aqui será abordado o porquê desta Gestão de Riscos, qual a sua demanda e seu objetivo principal e para isso a Gestão de Risco contará com o planejamento das Diretorias anualmente fornecendo e sinalizando a priorização operacional, além das ações e metas estratégicas da Companhia. As matrizes de risco serão assim confeccionadas pela Gerência de Risco por dois alinhamentos: o estratégico, a partir do Plano Estratégico da Companhia e operacional, a partir das demandas das Diretorias por meio de Plano Anual de Gestão de Risco.

Os contextos externo e interno:

O contexto apoia-se no estabelecimento e articulação dos objetivos que a empresa quer atingir. De acordo com o escopo em análise, estabelece-se os critérios para a gestão de risco a ser desenvolvida juntamente com o escopo e partes interessadas.

Para melhor elucidação, o contexto deve ser dividido em contexto interno e externo em relação à organização.

No estabelecimento do contexto destaca-se 3 elementos norteadores:

- A gestão de risco ocorre no contexto dos objetivos e atividades da organização.
- Fatores organizacionais podem ser uma fonte de risco, o que deve ser sempre levado em consideração.
- Propósito e escopo do processo de gestão de risco podem estar inter-relacionados com os objetivos da organização como um todo.

Referindo-se especificamente ao ambiente da atividade a qual o processo de Gestão de Riscos será aplicado, sua compreensão deve considerar, mas não somente:

- Contexto externo:

No contexto externo, deve ser abordado o ambiente legal, político, financeiro, tecnológico, econômico, dentre outros, que devem ser avaliados, considerando:

- Fatores sociais, culturais, políticos, jurídicos, regulatórios, financeiros, tecnológicos, econômicos e ambientais em âmbito local, regional, nacional e internacional;
- direcionadores-chave e tendências que afetam os objetivos da Companhia;
- relacionamentos (partes interessadas externas), percepções, valores, necessidades, expectativas;
- relações e compromissos contratuais, quando houver;

- Contexto interno:

No contexto interno, analisaremos a estrutura organizacional bem como a regimental e as respectivas responsabilidades, processos, gerenciamento das informações e a comunicação com as partes interessadas internas, considerando:

- visão, missão e valores;
- governança, estrutura organizacional, papéis e responsabilizações;
- estratégias, objetivos e políticas;
- cultura organizacional;
- normas, diretrizes e modelos adotados;
- recursos e competências;
- tecnologias disponíveis;
- relacionamentos (partes interessadas internas), percepções, valores, necessidades, expectativas

Os critérios de risco

Devem ser definidos conforme o escopo da atividade que será feita a Gestão de Riscos, considerando a quantidade e o tipo de riscos que podem ser assumidos, bem como sua relevância para os processos de tomada de decisão.

Os critérios devem ser continuamente analisados e alterados, se necessário, embora eles sejam definidos no início do processo de avaliação de riscos e, para sua definição, devem ser analisados:

- a natureza e o tipo de incertezas que podem afetar os resultados e objetivos;
- como as consequências e as probabilidades serão definidas e medidas;
- fatores relacionados ao tempo;
- consistência no uso de medidas;
- como o nível de risco será determinado;
- como a combinação de sequências de múltiplos riscos serão levadas em consideração;

Processo de avaliação de riscos

O processo de avaliação de riscos consiste em três etapas: identificação, análise e avaliação de riscos.

Utilizando das melhores informações disponíveis, esta etapa da gestão de riscos deve ser feita de forma sistemática, iterativa e colaborativa.

Serão adotados como referências técnicas para a Gestão de Riscos as normas ABNT NBR ISO 31000/2018, ABNT ISO 19011/2018, ABNT NBR ISO 31010/2012, ABNT NBR ISO/IEC GUIA 73/2005, ABNT ISO/TR 31004 agregadas ao COSO 2013 - Controles Internos – Estrutura Integrada.

Identificação dos riscos

Identificar um risco é encontrar, reconhecer e descrever os riscos que podem ajudar ou atrapalhar o atingimento de um objetivo, independentemente se sua fonte está ou não sob nosso controle, para isso, deve-se:

- Ter clareza quanto ao objetivo a ser trabalhado, como fator norteador daquela gestão de riscos;
- Descrever cada evento que impacta (negativamente ou positivamente) no alcance desse objetivo.

Esta etapa do processo deve ser feita por equipe técnica competente para o objeto analisado, podendo ser feita pelo gestor ou equipe, instituída para este fim, ou não, por meio de diversas técnicas, como, por exemplo, *brainstorming*, entrevistas, listas de verificação ou qualquer outra técnica que permita a maior identificação de riscos possível.

É neste momento que são identificados e descritos as causas, eventos e suas consequências potenciais, considerando o contexto definido na concepção, respondendo as seguintes perguntas-chave:

- Fontes de risco: o que pode dar origem a um risco para o meu objetivo?
- Eventos de risco: com base na fonte que eu identifiquei, o que precisa ocorrer, deixar de acontecer ou mudar para que se torne um risco?
- Consequências: se este evento acontecer, como isso afetaria no meu objetivo, individualmente ou cumulativamente com outro evento?

A identificação dos riscos deve necessariamente ser baseada nas melhores informações disponíveis, que devem ser disponibilizadas por seus produtores/detentores.

É importante considerar que as principais fontes de risco permeiam por pessoal (ex: pouca capacitação para execução da tarefa, desconhecimento do objetivo), processos (ex: falta de mapeamento dos processos, omissão ou morosidade de tramitações) e tecnologia (ex: inadequação ou indisponibilidade de recursos ou ferramentas tecnológicas).

Análise dos riscos

A análise dos riscos consiste em compreender a natureza e características dos riscos e nesta etapa que são definidos seus níveis, com base em uma análise detalhada das incertezas, fontes, eventos e consequências de riscos, cenários, controles existentes e sua eficácia.

As perguntas-chave para essa etapa são:

- Qual a chance desses eventos acontecerem?
- E se acontecerem, qual a magnitude de seus impactos para o atingimento dos meus objetivos?
- Eles podem acontecer sozinhos ou em cascata?
- Já existem controles e eles são eficientes?

O nível do risco é definido em uma escala de impacto e probabilidade, a serem distribuídos em uma matriz, considerando os seguintes aspectos:

- **Probabilidade:** chance de algo acontecer.
 1. **improvável:** chances mínimas do evento ocorrer.
 2. **raro:** pequenas chances de o evento ocorrer.
 3. **possível:** o evento tem chance de ocorrer.
 4. **provável:** é esperado que o evento ocorra, mas pode não ocorrer.
 5. **quase certo:** o evento ocorre, salvo em exceções.

- **Impacto:** qual o grau do efeito, caso o evento de risco ocorra:
 1. **desprezível:** impacto insignificante, compromete minimamente o atingimento do objetivo a ponto de não afetá-lo;
 2. **menor:** pequeno impacto, compromete de alguma forma, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo.
 3. **moderado:** impacto considerável para o alcance do objetivo, porém, recuperável.
 4. **maior:** impacto alto no atingimento do objetivo, de difícil reversão.
 5. **catastrófica:** impacto irreversível, compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo.

Portanto, a matriz se apresentará da seguinte forma:

Impacto/Probabilidade	1 – Improvável	2 – Raro	3 – Possível	4 – Provável	5 – Quase certo
5 – Catastrófica	5	10	15	20	25
4 – Maior	4	8	12	16	20
3 – Moderado	3	6	9	12	15
2 – Menor	2	4	6	8	10
1 – Desprezível	1	2	3	4	5

Modelo Matriz de Análise de Riscos

O nível do risco será definido pela multiplicação dos valores de referência de probabilidade x impacto e na concepção de cada processo de Gestão de Riscos, será definido o nível aceitável de risco para o atingimento dos objetivos daquele objeto, classificados sempre em baixo, moderado, alto e extremo.

Embora esta etapa seja detalhada metodologicamente, é comum que fatores sociais, culturais, baixa qualidade na informação disponibilizada, limitações técnicas e das técnicas utilizadas, entre outros, provoquem divergências de opiniões, percepções e julgamentos quanto à análise dos riscos. Caso isto ocorra, deverá ser devidamente documentado no processo e o conflito será mediado pela Gerência de Riscos, quando for o caso.

Avaliação dos riscos

Avaliar o risco consiste em comparar os resultados da análise dos riscos com os critérios estabelecidos, visando apoiar as decisões que precisarão ser tomadas, cabendo ao gestor decidir qual ação tomar, com base no ordenamento dos riscos por nível, devidamente documentadas e validas no nível apropriado da Companhia.

Esta decisão não consiste em mitigar os riscos, necessariamente, elas podem envolver:

- Fazer mais nada;
- Considerar as opções de tratamento de riscos;
- Realizar análises adicionais;
- Manter os controles existentes;

- Reconsiderar os objetivos.

Para apoiar esta decisão, os níveis de risco serão definidos na matriz de probabilidade x impacto, onde teremos:

RISCO BAIXO
RISCO MODERADO
RISCO ALTO
RISCO EXTREMO

- Faixa vermelha: riscos acima do limite de exposição, para estes, deve-se analisar pormenorizadamente suas fontes, causas e consequências;
- Faixas amarelas: riscos que necessitam de monitoramento;
- Faixa verde: riscos que podem ser aceitos, sem se adotar nenhum tipo de tratamento ou tomar nenhuma providência adicional, devido ao seu baixo ou nenhum impacto no atingimento do objetivo.

Tratamento dos riscos

Tratar o risco é abordar o risco, selecionar e implementar ações que o modifiquem.

Esta etapa deve ser iterativa e deve-se considerar:

- Formulação e seleção de opções de tratamento do risco;
- Planejamento e implementação do tratamento selecionado;
- Avaliação da eficácia do tratamento selecionado;
- Decisão acerca do aceite ou não do risco remanescente e sobre a necessidade de tratamento adicional.

É importante que antes da seleção de opções de tratamento, seja definido quem são os proprietários de risco, uma vez que é o responsável pelo risco que deve indicar a melhor forma de abordá-lo.

Seleção de opções de tratamento do risco

Para selecionar a opção mais adequada para tratar um risco, deve-se sempre levar em consideração o custo-benefício da implementação deste tratamento, avaliando se há um equilíbrio positivo entre os custos, esforços ou desvantagens em

face dos benefícios da implementação do tratamento, considerando os objetivos estratégicos, os critérios de risco e os recursos disponíveis.

É comum que a seleção do tratamento de um risco envolva mais de uma área da empresa, por isso, é importante uma comunicação e consulta clara com as partes interessadas e uma construção integrada de seleção e plano de tratamento de riscos, de modo a convergir as propostas e expectativas, para a consecução que um tratamento apropriado e eficaz.

Dentre as opções para tratar riscos, deve-se considerar as seguintes, como opções não excludentes de outras e que possam ser consideradas individualmente ou concomitantemente (como, por exemplo, reduzir a probabilidade de o risco ocorrer, concomitantemente com a estruturação de um plano de contingência, caso ele ocorra):

- Evitar o risco: não iniciando ou não dando continuidade à atividade que é a fonte do risco;
- Assumir ou aumentar o risco: quando identificado que é um risco positivo, de modo a perseguir uma oportunidade;
- Remover a fonte de risco: eliminar o elemento que dá origem ao risco;
- Mudar a probabilidade: mudar a chance de o evento ocorrer;
- Mudar as consequências: considerar os impactos da ocorrência desse risco no objetivo;
- Compartilhar o risco: trata-se de compartilhar os impactos da materialização do risco, como, por exemplo, por meio de contratação de seguros;
- Reter o risco por decisão fundamentada: a depender dos critérios definidos no processo.

É importante que, além de definir a melhor opção de tratamento, seja pormenorizado nessa etapa as ações que serão adotadas para viabilizar a opção escolhida, quais serão prioritárias e quais virão em cadeia (quando o tratamento de um risco afeta outro).

Em decorrência da implantação de tratamento em um risco, pode ser que seja introduzido um novo risco, o risco remanescente ou residual, que deve ser documentado e comunicado aos gestores afetos e, quando viável, aplicado a ele um tratamento adicional ou que seja feito sobre ele um monitoramento e análise crítica.

O monitoramento e a análise crítica, detalhados adiante, constituem etapa fundamental do tratamento de riscos, uma vez que a implementação das ações pré-estabelecidas podem não gerar o resultado esperado ou produzir consequências não previstas, bem como é necessário avaliar se a solução implementada foi ou se mantém adequada.

O Plano de Tratamento de Riscos

O Plano de Tratamento de Riscos visa estruturar a seleção de tratamento definida, favorecendo a comunicação e consulta, bem como o monitoramento e análise crítica.

Neste plano, devem conter no mínimo as seguintes informações:

- Ações: detalhamento das ações propostas;
- Justificativa: explicação do motivo da escolha daquela opção de tratamento;
- Responsáveis: são os responsáveis ou que podem ser responsabilizados pela gestão daquele risco, bem como pela aprovação, implantação e monitoramento do plano de tratamento;
- Recursos: identificação dos recursos requeridos, considerando recursos financeiros, tecnológicos, de pessoal, entre outros;
- Restrições: fatos e atos que limitam a implantação;
- Indicadores: como o desempenho do tratamento do risco será medido, para avaliar sua eficácia;
- Critérios de monitoramento e relatos: definição da forma e periodicidade do acompanhamento;
- Prazos: início e término esperados para realização de cada ação.

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS										
OBJETIVO:										
	Risco	Controle	Justificativa	Responsáveis	Recursos	Restrições	Indicadores	Monitoramento e relato	Prazo	
1				Aprovação:					Início:	
				Implementação:					Fim:	
2				Aprovação:					Início:	
				Implementação:					Fim:	
3				Aprovação:					Início:	
				Implementação:					Fim:	

MODELO DE PLANO DE TRATAMENTO

Monitoramento e análise crítica

O monitoramento da Gestão de Riscos deve ser contínuo e abordar a Gestão de Riscos na empresa como um todo, envolvendo a política, a concepção, os processos de Gestão de Riscos em si, seus controles etc, visando o seu acompanhamento e a melhoria contínua.

A análise crítica deve ser periódica e visa avaliar o desempenho e a efetividade, bem como propor quaisquer alterações e adequações em decorrência de mudanças de contexto ou ineficiência do que foi implementado.

Ao Conselho de Administração e à Alta Administração da empresa cabe o monitoramento do sistema de Gestão de Riscos implementado, a aplicação da Política

de Gestão de Riscos e o monitoramento dos riscos estratégicos, bem como monitorar mudanças de contexto estratégicas que afetam a gestão da Companhia.

Ao Comitê de Gestão de Riscos cabe monitorar os riscos: verificar, supervisionar, observar criticamente e acompanhar as situações para identificar mudanças necessárias, continuamente.

Este monitoramento será feito bimestralmente e deve constar:

- I. Nome do projeto
- II. Número do processo no SEI
- III. Data inicial
- IV. Objetivo principal
- V. Quantidade de riscos identificados
- VI. Quantidade de tratamento propostos
- VII. Percentual de implementação dos tratamentos
- VIII. Análise crítica do projeto

Aos proprietários de riscos cabe monitorar o risco ao longo do tempo, de modo a garantir que as respostas adotadas resultem na manutenção do risco em níveis adequados e reportar. A periodicidade do monitoramento dos riscos será especificada no Plano de Tratamento e deverá conter, no mínimo:

- I. Data
- II. Risco
- III. Análise inicial do risco
- IV. Tratamento proposto
- V. Percentual de implementação do tratamento
- VI. Análise do risco pós implementação do tratamento
- VII. Análise crítica acerca do tratamento monitorado
- VIII. Riscos que não possuem tratamento
- IX. Análise do risco sem tratamento
- X. Análise crítica acerca do risco sem tratamento proposto.

É imperativo que os riscos identificados e que não haja tratamento também sejam monitorados e avaliados criticamente periodicamente, bem como os riscos residuais inerentes da implementação do tratamento em um outro risco.

O monitoramento deve ser feito em documento padronizado e registrado no referente processo no SEI, para a concatenação das informações pela Gerência de Riscos e acompanhamento da Governança e Controle Interno.

Registro e Relato

O registro e o relato dos processos de Gestão de Riscos são de fundamental importância para manter o histórico do processo, propiciando a melhoria contínua da

Gestão de Riscos na empresa, além de fornecer as melhores informações aos tomadores de decisão e demais partes interessadas, portanto o registro e o relato visam:

- Comunicar atividades e resultados da Gestão de Riscos em toda a Companhia;
- Fornecer as melhores informações para a tomada de decisão;
- Promover a melhoria contínua da Gestão de Riscos e dos processos da Companhia;
- Facilitar a interação com as partes interessadas, principalmente àqueles com responsabilidades e responsabilizações referentes à Gestão de riscos no âmbito estratégico (alta administração), tático (superintendências e gerências) e operacional (proprietários de riscos).

Prezando sempre pela transparência dos atos da administração pública e pela segurança das informações estratégicas produzidas, os riscos não devem ser divulgados de forma ativa (em nosso sítio eletrônico), tampouco de forma passiva (quando solicitado por qualquer cidadão, nos termos da Lei 4.990 de 12 de dezembro de 2012 – a Lei de Acesso à Informação - LAI), porém, serão divulgados relatórios de monitoramento de desempenho, resguardando a segurança institucional, no que couber.

Comunicação e Consulta

A comunicação promove a conscientização e compreensão do risco. A consulta visa obter retorno e informações para a tomada de decisão.

Uma integração entre os dois, fomentada por um bom registro e relato, favorece a troca de informações factuais, oportunas, pertinentes, precisas e compreensíveis entre todos aqueles que possam influenciar ou ser influenciados por aquele risco, inclusive aos que precisem, com base nele, tomar decisões.

Para que a comunicação e a consulta sejam eficientes, é fundamental que se reúna uma equipe multidisciplinar, envolvendo empregados de todas as áreas em que aquele risco pode influenciar, para que todos os pontos de vista sejam considerados ao se estabelecer os critérios e ao se avaliar os riscos, fornecendo uma visão plural que facilita o consenso na supervisão dos riscos, aplicação dos planos de tratamento e na tomada de decisões, onde todos os afetados por aquele risco se sintam incluídos e participem do processo e que se garanta que lições anteriores sejam consideradas e sirvam de exemplo.

Formulário de Avaliação de Risco de Administradores (ANEXO I)

Considerando a responsabilidade de direcionar e monitorar os atos de gestão da Companhia, cabe a inserção em todos os processos decisórios o formulários com diretrizes mínimas de gestão de risco, a fim de que, antes da deliberação, o administrador detenha conhecimento motivado da área técnica sobre os impactos e probabilidade de seu ato.

Essa ação serve para melhorar a qualidade quanto à motivação das decisões dos administradores e, conseqüentemente, conceder maior segurança técnica e jurídica em seus posicionamentos atrelando o objeto do processo a dados estratégicos e/ou operacionais.

Ressalta-se que o formulário (Anexo I) foi criado para implicar consequência direta na efetividade dos atos decisórios da Companhia, cabendo aos gestores e conhecedores do risco definir seu grau de relevância institucional para então ocorrer a tomada de decisão da Alta Administração. Isso inclusive auxiliará o processo de gestão de risco da Companhia, desenvolvido pela Gerência de Risco, a qual a partir do preenchimento dos formulários pelas áreas técnicas, contará com mais subsídio de análise na elaboração de matrizes de risco da Companhia.

O apetite ao risco deve assim ser definido pelos administradores de acordo com as diretrizes relacionadas às metas e indicadores estratégicos (planejamento estratégico) e táticos (planejamentos das Diretorias) da Companhia, de competência da Gerência de Planejamento Estratégico, o que permite que a motivação decisória seja gerida de forma dinâmica pelos tomadores de decisão em relação aos objetivos institucionais.

Esse processo em relação aos formulários auxiliará na justificativa e na segurança decisória dos dirigentes, em colegiado ou não, e dos demais conselheiros, assim como na atuação da segunda linha de defesa para melhor prestação de serviço e subsídio à Alta Direção, inclusive quanto à prestação de informações às recomendações e prestações de contas à Órgãos de Controle, como Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF e a Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF.

Orientações Gerais

1. Este formulário deverá estar disponível em versão editável na intranet, bem como será encaminhado no e-mail institucional das Diretorias e Chefias de Assessoria.

2. Deve ser preenchido pela assessoria da diretoria demandante ou pela superintendência ou chefia de área demandante, quando for o caso.
3. Deve ser assinado pelo diretor demandante e superintendente ou chefe de área demandante ou pela assessoria da diretoria, quando for o caso;
4. Deve ser documento obrigatório em todas as pautas encaminhadas para deliberação dos administradores, em colegiados ou não, bem como incluídos nos processos demandantes no SEI.
5. A Gerência de Riscos estará disponível para auxiliar quanto à metodologia e preenchimento do formulário, mas não quanto ao conteúdo, sob a orientação da Área de Governança e Controle Interno. Não há necessidade que o processo seja encaminhado à GCI/Gerência de Risco.
6. Para mais de 2 eventos identificados, as tabelas devem ser reproduzidas (copiadas e coladas) no mesmo documento, com igual teor, diferenciando-se apenas quanto ao evento de risco identificado e sua análise e avaliação, bem como controles existentes.
7. Este Manual apresenta orientações quanto à identificação de eventos de risco, a análise de risco (impacto e probabilidade), a avaliação do risco (nível) e sobre o tratamento/controle, portanto, deve ser utilizado como base para consulta no preenchimento do formulário.

Referências Bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR ISO 31000: **Gestão de Riscos: Princípios e Diretrizes**. Rio de Janeiro, 2018.

_____. NBR ISO GUIA 73: **Gestão de Riscos: Vocabulário**. Rio de Janeiro, 2009.

_____. NBR ISO 31010: **Gestão de Riscos: Técnicas para o processo de avaliação de riscos**. Rio de Janeiro, 2012.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Manual de Gestão de Riscos Do TCU**. Segepres/Seplan – Brasília, Maio, 2018

THE COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREASURY COMMISSION - COSO. **Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance**. COSO 2017. Disponível em: <[https:// www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy- -and-Performance-Executive-Summary.pdf](https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf)>.

INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions). Sub- comitê de Normas de Controle Interno. **Diretrizes para Normas de Controle Interno do Setor Público – Informações Adicionais sobre Gestão de Risco nas Entidades**. INTOSAI GOV 9130. Viena, 2007. Tradução: Antonio Alves de Carvalho Neto. Brasília, 2013

REINO UNIDO (UK). HM Treasury. **Management of Risk - Principles and Concepts - The Orange Book**. HM Treasury do HM Government, 2004. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). **A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK Guide**, 3a. edição, 2004, PMI.

Glossário:

Análise crítica: atividade realizada para determinar a adequação, suficiência e eficácia do assunto em questão para atingir os objetivos estabelecidos.

Análise de riscos: processo de compreender a natureza do risco e determinar o nível de risco.

Apetite pelo risco: quantidade e tipo de riscos que uma organização está preparada para buscar, reter ou assumir.

Atitude perante o risco: abordagem da organização para avaliar e eventualmente buscar, reter, assumir ou afastar-se do risco.

Auditoria de gestão de riscos: processo sistemático, independente e documentado para obter evidências e avaliá-las de maneira objetiva, a fim de determinar a extensão na qual a estrutura da gestão de riscos, ou qualquer parte sua selecionada, é adequada e efetiva.

Avaliação de riscos: processo de comparar os resultados da análise de riscos com os critérios de risco para determinar se o risco e/ou sua magnitude é aceitável ou tolerável.

Comunicação e consulta: processos contínuos e iterativos que uma organização conduz para fornecer, compartilhar ou obter informações e se envolver no diálogo com as partes interessadas e outros, com relação a gerenciar riscos

Consequência: resultado de um evento que afeta os objetivos.

Contexto externo: ambiente externo no qual a organização busca atingir seus objetivos.

Contexto interno: ambiente interno no qual a organização busca atingir seus objetivos

Controle: medida que está modificando o risco.

Critérios de risco: termos de referência contra os quais a significância de um risco é avaliada.

Descrição dos riscos: declaração estruturada de riscos, contendo normalmente quatro elementos: fontes, eventos, causas e consequências

Estabelecimento do contexto: definição dos parâmetros externos e internos a serem levados em consideração ao gerenciar riscos e estabelecimento do escopo e dos critérios de risco para a política de gestão de riscos.

Evento: ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias

Evitar o risco: decisão informada de não se envolver, ou retirar-se de uma atividade, a fim de não ser exposto a um risco específico. Esta ação pode ser baseada nos resultados da avaliação de riscos e/ou em obrigações legais e regulatórias.

Compartilhamento de riscos: forma de tratamento de riscos que envolve a distribuição acordada de riscos com outras partes.

Fonte de risco: elemento que, individualmente ou combinado, tem o potencial intrínseco para dar origem ao risco.

Gestão de riscos: atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos.

Estrutura da gestão de riscos: conjunto de componentes que fornecem os fundamentos e os arranjos organizacionais para a concepção, implementação, monitoramento, análise crítica e melhoria contínua da gestão de riscos através de toda a organização.

Identificação de riscos: processo de busca, reconhecimento e descrição de riscos.

Matriz de risco: ferramenta para classificar e apresentar riscos definindo faixas para consequência e probabilidade.

Monitoramento: verificação, supervisão, observação crítica ou identificação da situação, executadas de forma contínua, a fim de identificar mudanças no nível de desempenho requerido ou esperado.

Nível de risco: magnitude de um risco, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades.

Parte interessada: pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada, ou perceber—se afetada por uma decisão ou atividade.

Percepção do risco: visão de risco da parte interessada.

Plano de gestão de riscos: esquema dentro da estrutura de gestão de riscos, que especifica a abordagem, os componentes de gestão e os recursos a serem aplicados para gerenciar riscos.

Política de gestão de riscos: declaração das intenções e diretrizes gerais de uma organização relacionadas à gestão de riscos.

Probabilidade (*likelihood*): chance de algo acontecer.

Processo de avaliação de riscos: processo global de identificação de riscos, análise de riscos e avaliação de riscos.

Processo de gestão de riscos: aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas de gestão para as atividades de comunicação, consulta, estabelecimento do

contexto, e na identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e análise crítica dos riscos.

Proprietário do risco: pessoa ou entidade com a responsabilidade e a autoridade para gerenciar um risco.

Relato: forma de comunicação destinada a informar partes interessadas específicas, internas ou externas, fornecendo informações relativas ao estado atual do risco e a sua gestão.

Registro de riscos: registro de informações sobre riscos identificados.

Resiliência: capacidade adaptativa de uma organização em um ambiente complexo e de mudanças.

Retenção de riscos: aceitação do benefício potencial de ganho, ou do ônus da perda, a partir de um risco específico.

Risco residual: risco remanescente após o tratamento do risco.

Risco: efeito da incerteza nos objetivos.

Tolerância ao risco: disposição da organização ou parte interessada em suportar o risco após o tratamento do risco, a fim de atingir seus objetivos

Tratamento de riscos: processo para modificar o risco.

Aprovação e Vigência

Este Manual deverá ser deliberado e revisado pela Diretoria Colegiada e sua vigência ocorrerá a partir da aprovação ou revisão pelo Conselho de Administração.

Anexo 1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Governança e Controle Interno

Gerência de Risco

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO DE ADMINISTRADORES

Formulário de preenchimento obrigatório pela assessoria ou superintendência/chefia de área demandante com respectivas assinaturas, bem como do diretor demandante em todas as pautas encaminhadas para deliberação individualmente ou pelos Órgãos Colegiados.

DELIBERAÇÃO	
Assunto:	
Processo:	

BATALHA RELACIONADA À DELIBERAÇÃO	
	Levar o METRÔ-DF para perto do cidadão e o cidadão para perto do METRÔ-DF
	Aprimorar a responsabilidade social e a sustentabilidade ambiental
	Fortalecer a gestão de pessoas
	Fortalecer a imagem institucional
	Fortalecer práticas de governança, transparência, integridade e gestão por resultados
	Diminuir a dependência financeira buscando a sustentabilidade dos negócios
	Melhorar qualidade do serviço prestado
	* Atividade estritamente operacional, técnica e/ou administrativa

VALOR GLOBAL ENVOLVIDO	
*responder caso a deliberação envolva contratação	
(3) ALTA	Acima de R\$ 1.000.000,00
(2) MÉDIA	Acima de R\$ 100.001,00, até R\$ 1.000.000,00
(1) BAIXA	Até R\$ 100.000,00
(0) N/A	NÃO ENVOLVE CONTRATAÇÃO

NÍVEL DE RELEVÂNCIA					
GRAVIDADE			URGÊNCIA		
(3) ALTA	Paralisação total das atividades operacionais, administrativas ou serviços.		(3) ALTA	Atendimento do pleito em até 10 dias.	
(2) MÉDIA	Paralisação parcial das atividades operacionais, administrativas ou serviços.		(2) MÉDIA	Atendimento do pleito entre 11 e 30 dias.	
(1) BAIXA	Não há paralisação de atividades.		(1) BAIXA	Atendimento do pleito em prazo superior a 30 dias.	

RISCO
EFEITO DA INCERTEZA NA CONSECUÇÃO DE UM OBJETIVO

Evento que pode afetar a consecução do objetivo (negativo ou positivo)

Evento:					
ANÁLISE DE RISCO					
PROBABILIDADE			IMPACTO		
	(5) QUASE CERTO	O evento ocorre, salvo em exceções.		(5) CATASTRÓFICO	Impacto irreversível, compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo.
	(4) PROVÁVEL	É esperado que o evento ocorra, mas pode não ocorrer.		(4) MAIOR	Impacto alto no atingimento do objetivo, de difícil reversão.
	(3) POSSÍVEL	O evento tem chance de ocorrer.		(3) MODERADO	Impacto considerável para o alcance do objetivo, porém, recuperável.
	(2) RARO	Pequenas chances de o evento ocorrer.		(2) MENOR	Pequeno impacto, compromete de alguma forma, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo.
	(1) IMPROVÁVEL	Chances mínimas do evento ocorrer.		(1) DESPREZÍVEL	Impacto insignificante, compromete minimamente o atingimento do objetivo a ponto de não afetá-lo.
AVALIAÇÃO DO RISCO – NÍVEL					
IMPACTO X PROBABILIDADE					
	1 a 4		BAIXO		
	5 a 9		MODERADO		
	10 a 19		ALTO		
	20 a 25		EXTREMO		
CONTROLE					
	SIM	O objeto de deliberação representa um tratamento para o risco identificado?			
	NÃO				
	SIM	Para o risco identificado, há a necessidade de tratamentos adicionais?			
	NÃO				
OBSERVAÇÕES					
